

# Voortgangsrapportage Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg

**Verslagperiode: januari t/m juni 2025**



## Inhoud

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Voorwoord</b>                                             | <b>3</b>  |
| <b>Samenvatting</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>Dashboard</b>                                             | <b>8</b>  |
| <b>1 Inleiding</b>                                           | <b>10</b> |
| <b>2 Governance en organisatie</b>                           | <b>11</b> |
| 2.1 Governance                                               | 11        |
| 2.2 Administratieve organisatie & interne beheersing (AO_IB) | 12        |
| 2.3 Bemensing programmteam                                   | 12        |
| <b>3 Doelstellingen</b>                                      | <b>13</b> |
| 3.1 Missie en hoofddoel WRL                                  | 13        |
| 3.2 Fysieke maatregelen - Pijler 1                           | 13        |
| 3.3 Water en bodem sturend – Pijler 2                        | 14        |
| 3.4 Waterbewustzijn en waterweerbaarheid – Pijler 3          | 14        |
| <b>4 Doelrealisatie en -monitoring pijlers</b>               | <b>15</b> |
| 4.1 Fysieke maatregelen - Pijler 1                           | 15        |
| 4.3 Waterbewustzijn en waterweerbaarheid - Pijler 3          | 18        |
| 4.4 Water in Balans                                          | 21        |
| <b>5 Doelrealisatie en -monitoring werkgebieden</b>          | <b>22</b> |
| 5.1 Leidraad                                                 | 23        |
| 5.2 Afwegingen in kader van de werk- en stroomgebiedsaanpak  | 23        |
| 5.3 Werkgebied Maastricht-Heuvelland                         | 24        |
| 5.4 Werkgebied Parkstad-Westelijke Mijnstreek                | 24        |
| 5.5 Werkgebied Midden-Limburg                                | 25        |
| 5.6 Werkgebied Noord-Limburg                                 | 26        |
| <b>6 Netwerkontwikkeling</b>                                 | <b>27</b> |
| <b>7 Internationale samenwerking</b>                         | <b>29</b> |
| 7.1 Programmatische samenwerking op stroomgebiedsniveau      | 29        |
| 7.2 Internationale projecten                                 | 29        |
| 7.3 Internationale werkbezoeken                              | 30        |
| <b>8 Communicatie en participatie</b>                        | <b>31</b> |
| <b>9 Programmabeheersing</b>                                 | <b>34</b> |
| 9.1 Contractmanagement                                       | 34        |
| 9.2 Planningsmanagement                                      | 34        |
| 9.3 Risicomanagement                                         | 34        |
| <b>10 Programmafinanciering</b>                              | <b>36</b> |
| 10.1 SPUK Beekdalen zijrivieren Maas Limburg                 | 36        |
| 10.2 Begroting en dekking 2025                               | 36        |
| 10.3 Bestedingen Q1 en Q2 2025                               | 36        |
| 10.4 Herfasering middelen                                    | 37        |
| 10.5 BTW compensatiefonds                                    | 37        |
| 10.6 Begroting 2026                                          | 37        |

## Voorwoord

Met deze vierde voortgangsrapportage nemen wij, alle WRL-partners, u graag mee in de voortgang van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. In de eerste helft van 2025 werkten we intensief aan verschillende thema's en zetten we belangrijke stappen vooruit. Dit werk vormt een stevig fundament voor een toekomstbestendige aanpak om Limburg beter te beschermen.

Het Geulgebied loopt voorop. Daar is de verkenning gestart om maatregelpakketten in kaart te brengen. In werkateliers en een online peiling is bij inwoners en stakeholders opgehaald welke uitdagingen en oplossingen zij zien. Wat we hier leren en onderzoeken kunnen we straks ook weer toepassen in de andere gebieden. Daarnaast grijpen we kansen aan die we vooruitlopend op de gebiedsaanpak kunnen uitvoeren. Zo draagt de kansenregeling bij aan lokale projecten die wateroverlast verminderen. De vele aanvragen laten zien dat er volop energie en ideeën in de regio aanwezig zijn.

Naast de start in Maastricht-Heuvelland krijgt de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking in de andere drie werkgebieden concreet vorm. We maken de beweging van een verbindende naar een vertegenwoordigende governance en zetten stevige stappen in de verdere opbouw van het programmameteam en de programmabeheersing. Dit versterkt de samenwerking in de regio en het vergroot onze slagkracht in de uitvoering.

Naast de ontwikkelingen binnen WRL, richtten we ons het afgelopen half jaar ook op kennisdeling met nationale en internationale partners. Een bijzonder moment was het bezoek van Deltacommissaris Co Verdaas, die onze aanpak complimenteerde – een mooie erkenning voor WRL.

Natuurlijk liggen er ook uitdagingen. Zoals de voortgang in de werkgebieden, een scherpere begroting en besteding van middelen, en betere monitoring en evaluatie. Deze thema's krijgen de komende periode extra aandacht.

Met vertrouwen kijken we uit naar de tweede helft van 2025. Samen bouwen we verder aan een sterke, toekomstbestendige aanpak.

**Michael Theuns**

Voorzitter Regionale Actietafel Waterveiligheid en Ruimte Limburg



## Samenvatting

**De eerste helft van 2025 werd vanuit het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) verder gebouwd aan een stevig fundament. We maken de beweging naar een nieuwe governance die de Limburg brede samenwerking verankert en de slagkracht vergroot. De producten en activiteiten in de pijlers krijgen steeds meer vorm en de samenwerking in de werkgebieden groeit. Naast de lange termijn aanpak is er ook ruimte voor acties die op korte termijn effect hebben. Tegelijkertijd blijven er uitdagingen voor de programmabeheersing.**

### Voortgang in de werkgebieden

In het werkgebied Maastricht-Heuvelland is de verkenning van het Geulgebied voortvarend gestart, met brede betrokkenheid van inwoners en stakeholders. Hun ideeën worden meegenomen in de uitwerking van varianten die volgend jaar verder worden onderzocht in een plan-MER. We onderzoeken hoe en waar verschillende maatregelen als onderdeel van een totaalpakket uitgevoerd kunnen worden. Het gaat dan onder andere om natuurlijke maatregelen, het benutten van dalvlaktes voor waterberging, en het vergroten van de afvoercapaciteit. Deze kennis vormt ook input voor de andere gebieden. In Parkstad-Westelijke Mijnstreek is gestart met het werkgebiedsplan en de aanpak voor het stroomgebied van de Geleenbeek. In het werkgebied Midden-Limburg (het gebied ten oosten van de Maas) werken we aan een gezamenlijke aanpak voor de Maas (vanuit het HWBP-traject) en de Roer. In Noord-Limburg lopen verkennende gesprekken.

Grote stappen zijn gezet met de ontwikkeling van een WRL-leidraad die als een spoorboekje helpt bij het opstellen van onderling vergelijkbare uitvoering- en gebiedsplannen en toetsingskaders. Input hiervoor is opgehaald in inhoudelijke workshops met de partners. Dit heeft tevens bijgedragen aan het versterken van de onderlinge samenwerking.

### Acties korte termijn

Ondertussen wordt ook ingezet op de korte termijn. Via de Kansenregeling ondersteunt WRL concrete projecten die wateroverlast verminderen en snel uitvoerbaar zijn. De belangstelling is groot: in de eerste helft van 2025 zijn 47 aanvragen ontvangen. Eind juni was al 20% van het totale beschikbare budget van 5 miljoen euro besteed, terwijl nog eens 50% in behandeling was. Vanwege het grote animo is de eerste tranche verlengd tot eind 2025. De kansenregeling maakte lokale projecten mogelijk zoals de aanleg van een waterbuffer onder het Raadhuisplein in Heerlen, een hoogwatergeul bij Nijswiller, de herinrichting van de Vaalsbroekermolenbeek en het ombouwen van mestputten tot waterreservoirs bij Natuurboerderij De Hofkamer in Wahlwiller. Daarnaast pakt WRL de uitwerking van verschillende maatregelen bij de Geulmondig met prioriteit op.

### Water en bodem sturend

In april zijn nieuwe overstromings- en waterveiligheidskaarten op basis van klimaatscenario's voor 2100 vastgesteld. Deze zijn bestemd voor de ontwikkeling van beleid en advisering over ruimtelijke plannen. Daarnaast wordt verkend hoe risicogerichte normering kan worden ingezet. Hiervoor is een intensieve samenwerking gestart met Waterschap Limburg.

### Bewustwording

Naast preventie zet WRL stevig in op bewustwording en het verhogen van waterweerbaarheid. In de eerste helft van 2025 is de pilot met woningscans in negen gemeenten afgerond. Binnen de pilot zijn ook scans uitgevoerd bij gebouwen met een maatschappelijke functie zoals een ziekenhuis en

zorginstelling. De verbeterpunten uit de pilot worden gebruikt in een brede vervolgaanpak. Tegelijk was er veel aandacht voor communicatie en educatie. Via de campagne Wacht niet op water, informatiematerialen en een uitbreiding van de Risk Factory verhogen we het waterbewustzijn bij verschillende doelgroepen. Uit een eerste inwonersonderzoek blijkt dat blijvende inzet nodig is om mensen te stimuleren om in actie te komen.

### **Early warning**

Samen met Waterschap Limburg werken we aan het versneld doorontwikkelen van een early warning systeem waarmee belanghebbenden 24/7 kunnen worden geïnformeerd over dreigende wateroverlast en droogte. Hiervoor participeren we in verschillende internationale projecten. Daarnaast is het hoogwatervoorspelsysteem van de Geul verbeterd en werken we aan een extra functionaliteit in de waterstandenapp die het mogelijk maakt om push-berichten te verzenden.

### **Nieuwe governance**

Naast de inhoudelijke pijlers en samenwerking in de gebieden, werken we aan de verdere professionalisering van het programma. Met een nieuwe governance met een bestuurscommissie verankeren we de samenwerking in de regio en vergroten we de slagkracht in de uitvoering. Het ontwerp instellingsbesluit voor de Bestuurscommissie WRL ligt klaar en de governance voor de werkgebieden wordt verder uitgewerkt.

De eerste helft van 2025 laat zien dat WRL stevig aan de slag is. De ambitie is groot, de samenwerking krijgt vorm en de betrokkenheid groeit. Er zijn belangrijke stappen gezet om samen - overheid, partners en inwoners – te werken aan een waterweerbaar Limburg.

# Op weg naar een waterweerbaar Limburg

Voortgangsrapportage WRL  
januari t/m juni 2025

## Wateroverlast en overstromingen nemen door klimaatverandering toe.

Om Limburg beter te beschermen werken overheden samen in het **programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)**

We doen dat in 4 werkgebieden **vanuit 3 pijlers**

Highlights voortgang deze periode

afgerond  
loopt  
nog te starten



## 1 Fysieke maatregelen (water vasthouden, bergen en afvoeren)

Kansenregeling 1e tranche 5 miljoen euro:

- 20% budget besteed
- 50% in behandeling

Onderzoek kansrijke maatregelen Geulgebied

Korte termijn aanpak Bunde



## 2 Water en bodem sturend (slimme ruimtelijke keuzes)

Overstromingskaarten T100/2100

Handelingsperspectief bij overstromingskaarten

Ontwikkeling WRL-leidraad eenduidige gebiedsaanpak

Verkenning risicogerichte normering

Instrumentenmix grondstrategie



## 3 Waterbewustzijn en waterweerbaarheid (iedereen voorbereiden)

Pilot woningscans

Ontwikkeling brede vervolgaanpak woningscans

Educatie: Risk Factory voortgezet onderwijs

Inwonersonderzoek 1e editie

Ontwikkeling early warning systeem

Ontwikkeling hulpmiddelen zoals draaiboeken en brochures

Campagne 'Wacht niet op water'

Ontwikkeling publiekstool overstromingsrisico



Vanuit deze pijlers stellen we een samenhangend maatregelenpakket samen in de werkgebieden.

## 4 werkgebieden

Vanuit de 3 pijlers stellen we een samenhangend maatregelenpakket samen.

We versterken de samenwerking binnen de werkgebieden. Zo bouwen we zowel aan een gemeenschappelijk fundament als aan maatwerk per werkgebied.

Ieder gebied volgt gemeenschappelijke uitgangspunten en kaders uit de WRL-leidraad.



### Organisatie



#### Financiën

Bestedingen blijven nog achter op begroting. We bekijken mogelijkheden om te versnellen. Grote bestedingen verwachten we pas in de uitvoeringsfase.



#### Governance

We werken aan een nieuwe structuur met een bestuurscommissie, voor meer slagkracht en vertegenwoordiging vanuit alle werkgebieden. Daarnaast komt er per werkgebied een samenwerkingsovereenkomst (SOK).



#### Personele bezetting

Nog niet alle rollen zijn ingevuld, maar we zijn op de goede weg!



#### Netwerkontwikkeling

We bouwen een (eu)regionaal netwerk met focus op waterveiligheid en wateroverlast.

### 1 Werkgebied Maastricht-Heuvelland

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Werkgebiedsplan       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bestuurlijk regieteam | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Prioritair stroomgebied: Geul

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Onderzoek                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verkenning (nov 2024 - nov 2027) | <input type="checkbox"/>            |
| Internationale samenwerking      | <input type="checkbox"/>            |

### 2 Werkgebied Parkstad en Westelijke Mijnstreek

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Werkgebiedsplan       | <input type="checkbox"/> |
| Bestuurlijk regieteam | <input type="checkbox"/> |

#### Prioritair stroomgebied: Geleenbeek

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Onderzoek  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verkenning | <input type="checkbox"/>            |

### 3 Werkgebied Midden-Limburg

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Werkgebiedsplan       | <input type="checkbox"/> |
| Bestuurlijk regieteam | <input type="checkbox"/> |

#### Prioritair stroomgebied: Roer

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Onderzoek                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verkenning                  | <input type="checkbox"/>            |
| Internationale samenwerking | <input type="checkbox"/>            |

### 4 Werkgebied Noord-Limburg

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Werkgebiedsplan       | <input type="checkbox"/> |
| Bestuurlijk regieteam | <input type="checkbox"/> |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Pre-verkenning (onderzoek) | <input type="checkbox"/> |
| Verkenning                 | <input type="checkbox"/> |

### Er gebeurt heel veel!

- De inhoud krijgt steeds meer vorm.
- De samenwerking in de werkgebieden groeit.

**We zitten in een goede flow en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.**

## Dashboard

In onderstaand dashboard is in één oogopslag weergegeven wat de stand van zaken is per onderwerp. Een toelichting op de verschillende onderdelen is terug te vinden in de voorliggende rapportage.

| Legenda | Overall                   | Financieel          | Tijd                   | Kwaliteit         |
|---------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|         | Invulling n.v.t.          |                     |                        |                   |
|         | Te starten in latere fase |                     |                        |                   |
|         | Geen bijzonderheden       | Tot 105% van budget | Binnen planning        | Conform eisen     |
|         | Aandacht vereist          | Tot 110% van budget | < 6 mnd overschrijding | Te herstellen     |
|         | Actie vereist             | >110% van budget    | > 6mnd overschrijding  | Aanpassing budget |

| Pijlers                                 |                                                             |          |          |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Verwij-<br>zing                         | Onderdeel                                                   | Pijler 1 | Pijler 2 | Pijler 3 |
| <i>Generieke projecten en processen</i> |                                                             |          |          |          |
| §4.1                                    | Onderzoeken                                                 |          |          |          |
|                                         | Kansenregeling                                              |          |          |          |
| §4.2                                    | Implementatie aanbevelingen Beleidstafel                    |          |          |          |
|                                         | Ruimte voor water - Handelingsperspectief en kaart          |          |          |          |
|                                         | Grondstrategie en overige instrumenten                      |          |          |          |
|                                         | Verkenning risicogerichte normering                         |          |          |          |
|                                         | Leidraad Aanpak werk-en stroomgebiedsplannen                |          |          |          |
|                                         | Verankering in POVI en opnamen regelgeving in verordeningen |          |          |          |
|                                         | Tijdelijke voorzorgsmaatregelen                             |          |          |          |
| §4.3                                    | <i>Spoor 1 - Early Warning</i>                              |          |          |          |
|                                         | Quick win waarschuwen en informeren                         |          |          |          |
|                                         | Marktoriëntatie Early Warning systemen                      |          |          |          |
|                                         | AI4Water                                                    |          |          |          |
|                                         | Interreg NWE-project FlashFloodBreaker                      |          |          |          |
|                                         | Aanpassingen aan het systeem FEWS Geul                      |          |          |          |
|                                         | Afstemming WRL-RWS over lopende Early Warning en AI act.    |          |          |          |
|                                         | <i>Spoor 2 - Waterweerbaarheid</i>                          |          |          |          |
|                                         | Wateradviesteams en woningscans                             |          |          |          |
|                                         | Draaiboeken voor buurten                                    |          |          |          |
|                                         | Bijeenkomst voor instellingen met een collectie             |          |          |          |
|                                         | Publicaties                                                 |          |          |          |
|                                         | <i>Spoor 3 – Waterbewustzijn en Educatie</i>                |          |          |          |
|                                         | Vanuit één loket communiceren                               |          |          |          |
|                                         | Ambassadeurscampagne                                        |          |          |          |
|                                         | Educatie                                                    |          |          |          |
|                                         | Voorbereidingen Inwonersonderzoek 2025-2028                 |          |          |          |

| Werkgebieden       |                                         |                           |                                       |                    |                   |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Verwij-<br>zing    | Onderdeel                               | Maastricht-<br>Heuvelland | Parkstad-<br>Westelijke<br>Mijnstreek | Midden-<br>Limburg | Noord-<br>Limburg |
| <i>Onderzoeken</i> |                                         |                           |                                       |                    |                   |
| §4.1               | Verkenning flood-bypass Valkenburg      |                           |                                       |                    |                   |
|                    | Onderzoek dalbodemberging               |                           |                                       |                    |                   |
|                    | Onderzoek bedijking Bunde               |                           |                                       |                    |                   |
|                    | Bescherming Adelante                    |                           |                                       |                    |                   |
|                    | Modelontwikkeling LISEM                 |                           |                                       |                    |                   |
|                    | Verkenning hydraulische knelpunten Geul |                           |                                       |                    |                   |
|                    | Verkenning Mechelderbeek-Geul           |                           |                                       |                    |                   |
|                    | Deelonderzoek Nature Based Solutions    |                           |                                       |                    |                   |
| §4.2               | Onderzoeken volgen in een latere fase   |                           |                                       |                    |                   |
| §4.3               | Onderzoeken volgen in een latere fase   |                           |                                       |                    |                   |
| §4.4               | Onderzoeken volgen in een latere fase   |                           |                                       |                    |                   |

| Programmabureau |                              |             |                                           |                            |                          |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Verwij-<br>zing | Onderdeel                    | Organisatie | Strategie en<br>international-<br>isering | Programma-<br>communicatie | Programma-<br>beheersing |
| H2              | Bestuurscommissie en AO_IB   |             |                                           |                            |                          |
|                 | Bemensing                    |             |                                           |                            |                          |
| H7              | Internationale samenwerking  |             |                                           |                            |                          |
| H8              | Communicatie en Participatie |             |                                           |                            |                          |
| H9              | Contractmanagement           |             |                                           |                            |                          |
|                 | Planningsmanagement          |             |                                           |                            |                          |
|                 | Risicomanagement             |             |                                           |                            |                          |
| H10             | Programmafinanciering        |             |                                           |                            |                          |
| §10.3           | Programmabestedingen         |             |                                           |                            |                          |

## 1 Inleiding

Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) is een programma van en voor de Limburgse overheden, ontstaan naar aanleiding van de overstromingen in juli 2021. In WRL werken de Provincie Limburg, het Waterschap Limburg, de 31 Limburgse gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan de opgave om Limburg beter te beschermen en voor te bereiden op (extreme) wateroverlast. Dit is een meerjarige opgave. WRL heeft de focus op het regionale watersysteem (beken en zijrivieren van de Maas), met ook aandacht voor het hoofdwatersysteem.

Elke zes maanden stelt WRL een voortgangsrapportage op. Met deze rapportage wordt verantwoording afgelegd aan onze opdrachtgevers en wordt grip gehouden op de sturing van het programma. De voortgangsrapportage refereert aan het Opbouwplan 'Gericht aan de slag!' dat op 5 april 2023 is vastgesteld door de Regionale Actietafel WRL. De besturen van onze partnerorganisaties betrekken de halfjaarlijkse rapportage ook bij de gebruikelijke planning & control cycli.

### Over deze voortgangsrapportage

Deze vierde voortgangsrapportage beschrijft de ontwikkelingen binnen het WRL-programma in de periode van januari tot en met juni 2025. Centraal in deze rapportage staat de integrale opgave, vormgegeven vanuit drie inhoudelijke pijlers en vier werkgebieden. In de afgelopen maanden is veel werk verzet om de organisatie en governance te versterken en zo de samenwerking rondom deze opgave verder te professionaliseren waardoor we snel en goed voorbereid tot uitvoering komen. Hoofdstuk 2 gaat in op de overgang van een verbindende naar een vertegenwoordigende governance.

De doelstellingen uit het Opbouwplan vormen de basis voor de uitwerking van de plannen op pijler- en werkgebiedsniveau. Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van alle vastgestelde doelstellingen. De voortgang op de drie pijlers wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Deze pijlers leveren input voor de maatregelpakketten die per werkgebied worden samengesteld. Daarnaast is er aandacht voor overkoepelende activiteiten die bijdragen aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.

Hoofdstuk 5 beschrijft hoe de aanpak per werkgebied in het afgelopen halfjaar is uitgewerkt. Om te zorgen dat alle werkgebieden volgens dezelfde systematiek werken bij het definiëren en prioriteren van maatregelen, wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijke WRL-leidraad. De hoofdstukken 6 en 7 laten zien hoe WRL werkt aan het leggen van verbindingen tussen diverse sectoren en het bouwen van een (eu)regionaal netwerk.

In hoofdstuk 8 wordt toegelicht hoe communicatie als belangrijk instrument wordt ingezet en op welke manieren inwoners worden betrokken. Tot slot is er een toelichting over de ontwikkeling van programmabeheersing in hoofdstuk 9 opgenomen en wordt in hoofdstuk 10 nader ingegaan op de financiële verantwoording.


## 2 Governance en organisatie

De overstromingen van juli 2021 maakten duidelijk dat een andere aanpak gewenst is om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Samenwerking over (gemeente)grenzen is hiervoor noodzakelijk. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe WRL een bijdrage levert om deze samenwerking tussen overheden verder vorm te geven. Tevens wordt ingegaan op de bemensing van het programmteam WRL.

### 2.1 Governance

Sinds de oprichting in juli 2022 werkt WRL met een "verbindende" governance, waarbij de Provincie Limburg als hostorganisatie optreedt. Dit heeft in het daaropvolgende jaar geleid tot oprichting van de Regionale Actietafel (RAT), het ambtelijk opdrachtgeverschap (AOG), en het programmteam WRL.

WRL is geen juridische entiteit, wat leidt tot onduidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties. Om de Rijksbijdrage van € 300 miljoen effectief te kunnen inzetten voor het regionale watersysteem, bleek dat een andere governance nodig is. In 2024 koos de Regionale Actietafel WRL voor het instellen van een bestuurscommissie en het uitwerken van samenwerkingsovereenkomsten als beste optie voor de governance van het programma WRL. In de afgelopen periode is deze opzet verder uitgewerkt.

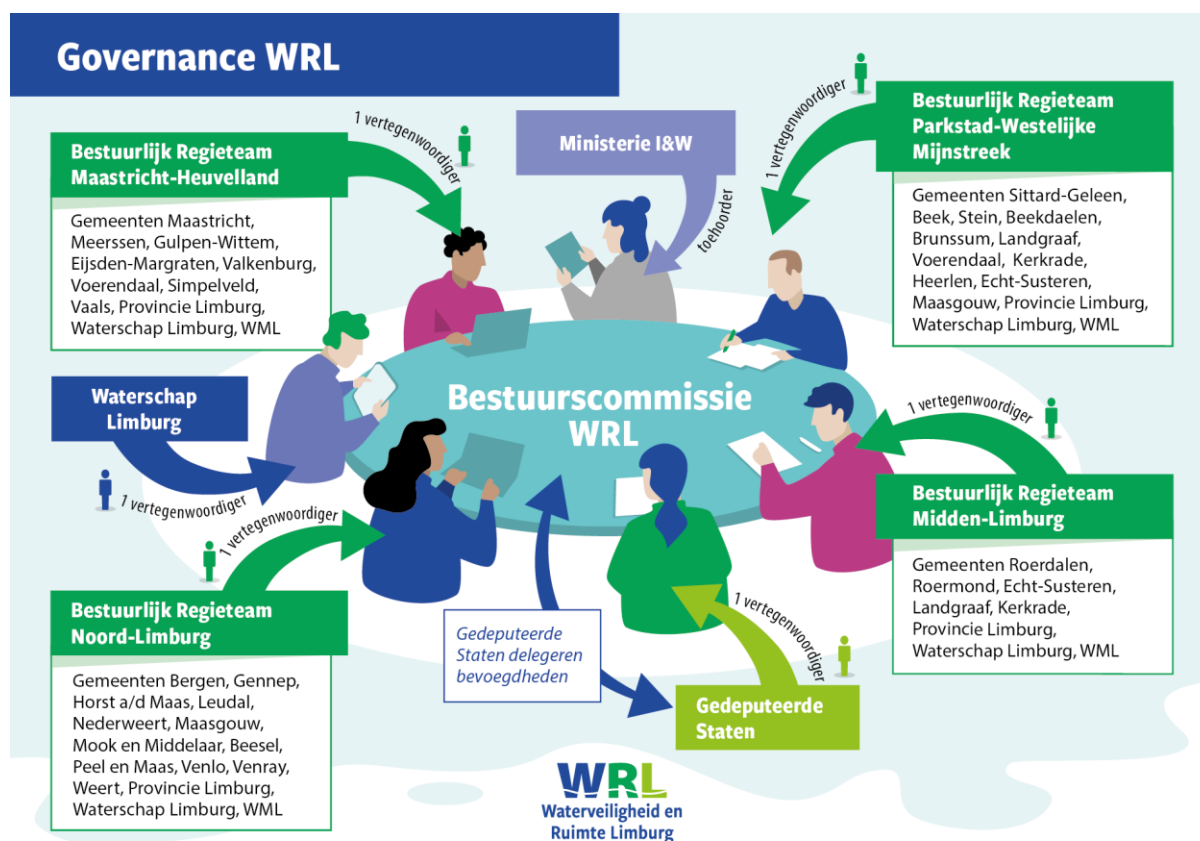

#### *Bestuurscommissie WRL*

In de Bestuurscommissie WRL worden alle werkgebieden vertegenwoordigd door een bestuurder vanuit de bestuurlijke regieteams van de werkgebieden. Tevens neemt een bestuurder vanuit Waterschap Limburg en een bestuurder vanuit de Provincie Limburg zitting in de bestuurscommissie. Het Rijk is toehoorder. Het college van Gedeputeerde Staten gaat een aantal van haar

bevoegdheden ten aanzien van WRL delegeren aan de Bestuurscommissie WRL. Welke bevoegdheden dat zijn en hoe de bestuurscommissie hierover verantwoording gaat afleggen, wordt vastgelegd in het instellingsbesluit. In de afgelopen periode stelden we het instellingsbesluit op en doorliepen we de vereiste stappen richting vaststelling. Op 20 juni 2025 besloot Provinciale Staten unaniem geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het instellen van de Bestuurscommissie WRL. Gedeputeerde Staten kunnen nu definitief besluiten om de Bestuurscommissie WRL in te stellen.

De instelling van de Bestuurscommissie WRL vindt plaats op 27 november 2027. Op dat moment is het handboek AO\_IB gereed (zie paragraaf 2.2) en de afvaardiging vanuit de vier bestuurlijke regieteams geregeld.

### *Governance werkgebieden*

WRL werkt gebiedsgericht. Limburg is hiervoor opgedeeld in vier werkgebieden, elk met eigen specifieke kenmerken en watergangen: Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek, Midden-Limburg en Noord-Limburg. Voor elk werkgebied komt een Bestuurlijke Regieteam (BRT). Om maatwerk te kunnen leveren in de verschillende werkgebieden, wordt per werkgebied een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten. De voorbereidingen voor deze overeenkomsten zijn gestart.

## **2.2 Administratieve organisatie & interne beheersing (AO\_IB)**

De Bestuurscommissie WRL is een bestuursorgaan van de Provincie Limburg, zonder eigen personeel. De Provincie Limburg blijft de hostorganisatie voor WRL. Het Handboek Administratie Organisatie & Interne Beheersing (AO\_IB) legt vast hoe de dienstverlening door en de samenwerking met de Provincie Limburg is geregeld. Dit Handboek AO\_IB moet gereed zijn bij de instelling van de bestuurscommissie en wordt vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten en de Bestuurscommissie WRL. In juni 2025 zijn we gestart met het opstellen van het handboek en het beschrijven van de interne processen van het programmteam WRL.

## **2.3 Bemensing programmteam**

In de afgelopen periode zijn 9 rollen ingevuld. De in 2024 ingezette versnelling is hiermee doorgezet. Desondanks blijft het aantrekken van gekwalificeerd personeel een uitdaging gezien de huidige arbeidsmarkt. Met de partnerorganisaties zijn we voortdurend in gesprek over een duurzame invulling van de benodigde programmacapaciteit. Hierbij wordt breed gekeken naar mogelijkheden om rollen in te vullen bijvoorbeeld via inhuur/detacheringen, opdrachten of (tijdelijke) contracten.

## 3 Doelstellingen

De doelstellingen zoals opgenomen in het Opbouwplan zijn leidend voor de uitwerking in de werkgebiedsplannen. In de werkgebiedsplannen worden de doelstellingen verder uitgewerkt, zodat samen met de betrokken partners concrete uitvoeringsprogramma's kunnen worden opgesteld.


### 3.1 Missie en hoofddoel WRL

#### *Missie*

Limburg samen beter voorbereiden en beschermen tegen extreme neerslag.

#### *Hoofddoel*

Voor ieder werkgebied in Limburg komen tot een integrale aanpak van de wateroverlast op basis van meerlaagsveiligheid: preventie, gevolgbepending en waterbewustzijn.

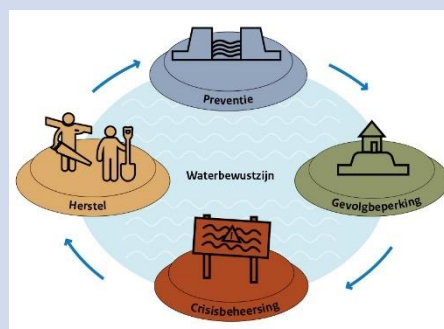


### 3.2 Fysieke maatregelen - Pijler 1

#### *Doel pijler 1*

Vergroten van de fysieke robuustheid van het watersysteem en daarmee het verlagen van de waterstand op de plekken waar overlast is geweest of kan ontstaan en/of het beter beschermen van deze locaties tegen hoge waterstanden.

Pijler 1 onderzoekt oplossingsrichtingen en werkt deze uit tot concrete, haalbare maatregelen om wateroverlast en overstromingsrisico's te verminderen. Zowel voor de korte als lange termijn. Dit omvat:

- Vergroten van de sponswerking van de bodem;
- Natuurlijk en civieltechnisch bergen van water;
- Vergroten van de afvoercapaciteit van waterstromen;
- Beschermen van kwetsbare gebieden door technische ingrepen.

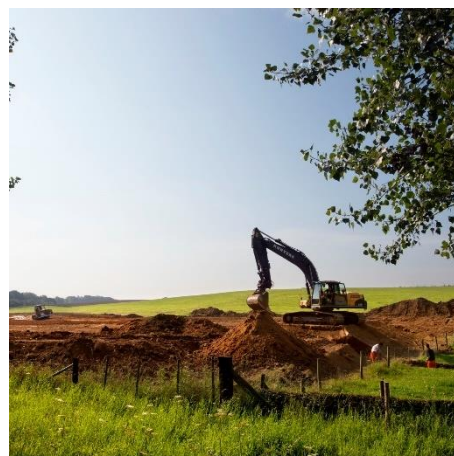

### 3.3 Water en bodem sturend – Pijler 2

#### *Doel pijler 2*

Verankeren van water en bodem sturend als principe in de ruimtelijke ordening en grondgebruik.

Pijler 2 richt zich op:

- Invulling ‘Water en bodem sturend’ als handreiking voor beleidsontwikkeling voor wateroverlast en waterveiligheid, toepasbaar voor heel Limburg;
- Vertalen naar en verankeren in RO-instrumenten voor de gewenste inrichting van stroomgebieden;
- Delen kennis en ervaring en daarmee een voorbeeldfunctie vervullen voor andere delen van Nederland.



### 3.4 Waterbewustzijn en waterweerbaarheid – Pijler 3

#### *Doel pijler 3*

Vergroten van de weerbaarheid van inwoners om schade bij (extreme) wateroverlast te beperken.

Pijler 3 richt zich op:

- Verbeteren van waarschuwingssystemen en (publieks)communicatie (early warning);
- Ontwikkelen van producten en diensten om verschillende doelgroepen te helpen bij het voorbereiden op wateroverlast en schade te beperken;
- Ontwikkelen van campagnes en educatieve programma's om waterbewustzijn te verhogen.



## 4 Doelrealisatie en -monitoring pijlers

### 4.1 Fysieke maatregelen - Pijler 1

#### 4.1.1 Kanseregeling

Met de Kanseregeling stelt WRL in totaal €10 miljoen ter beschikking voor direct uitvoerbare maatregelen tegen wateroverlast. De regeling is opgedeeld in twee tranches. De eerste tranche van €5 miljoen is opengesteld op 3 december 2024. De focus ligt op zogenoemde 'no-regret'-maatregelen: acties die snel effect hebben, toekomstbestendig zijn en geen ongewenste effecten hebben op een andere plek.

Per 26 juni 2025 zijn 47 aanvragen voor de kanseregeling ingediend. Hiervan zijn 13 beschikt en 14 nog in behandeling. Hiermee is ca. 20% van het budget uitgegeven en nog eens 50% in behandeling. In bijlage 2 is een overzicht van de beschikte projecten opgenomen.

Om de besteding van het resterende budget mogelijk te maken, is door de Regionale Actietafel op 25 juni besloten de indieningsperiode van de eerste tranche voor de kanseregeling te verlengen t/m 15 december 2025 en de subsidie deelplafonds te laten vervallen.

In de zomer van 2025 start een evaluatie. De bevindingen worden meegenomen bij de vormgeving van de tweede tranche die begin 2026 wordt opengesteld.



#### 4.1.2 Voortgang onderzoeken

De verkenning voor het stroomgebied van de Geul is gestart en richt zich op het samenstellen van een uitvoeringspakket voor het hele gebied. Pijler 1 werkt de bouwstenen (verschillende soorten maatregelen) uit voor dit uitvoeringspakket. Tevens werkt pijler 1 aan de doorontwikkeling van modellen om de juiste berekeningen te kunnen maken. De resultaten worden ook gebruikt voor de andere werkgebieden.

| Activiteit                                | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Onderzoek Nature Based Solutions</i>   | In Zuid-Limburg en België worden op basis van landschapskenmerken kansenskaarten opgesteld. Deze kaarten geven specifieke locaties aan waar ongeveer 20 typen natuurlijke maatregelen kunnen worden toegepast. Eind 2025 worden de resultaten verwacht. Voor dit project wordt nauw samengewerkt met Waalse partners. |
| <i>Onderzoek dalbodemberging</i>          | We onderzoeken hoe berging op de dalbodems kan worden toegepast. Doel is inzicht te krijgen in de hydrologische werking van de dalbodemberging, de civieltechnische uitwerking en het maximale bergingspotentieel.                                                                                                    |
| <i>Verkenning flood-bypass Valkenburg</i> | Een ondergrondse 'flood-bypass' kan de afvoercapaciteit van Valkenburg vergroten. Momenteel onderzoeken wij of dit een haalbare oplossing is, wat het kost en wat de impact op de omgeving is.                                                                                                                        |
| <i>Modelontwikkeling LISEM</i>            | We ontwikkelen een neerslag-afvoer model om het effect van verscheidene Nature Based Solutions en andere maatregelen in de                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | landelijke delen van het stroomgebied van de Geul te kunnen berekenen. Hiervoor is het Limburg Soil Erosion Model (LISEM) als meest geschikt geselecteerd. Een aanpak voor deze modelontwikkeling is uitgewerkt en de opdrachtnemer is in maart 2025 begonnen met de bouw van het rekenmodel. Najaar 2026 wordt een gekalibreerd model verwacht dat de natuurlijke maatregelen vertaalt in de juiste input voor het D-Hydro model. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.1.3 Korte termijn aanpak

We werken aan verschillende kansrijke maatregelen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden.

| Activiteit                     | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Maatregelen Geulmonding</i> | Naar aanleiding van de Verkenning Geulmondingsgebied in 2024 zijn diverse maatregelen geselecteerd die met prioriteit worden uitgewerkt. Voor de bedijking onderzoeken en vergelijken we twee varianten. We werken ook aan het stroomlijnen van de sifon met bovenschotten, Hiervoor maken we een technisch ontwerp waarna een besluit genomen kan worden over financiering en uitvoering. Tevens bekijken we hoe we de houtvang bij de sifon robuuster kunnen inrichten |
| <i>Bescherming Adelante</i>    | We onderzoeken hoe een kade bescherming kan bieden aan de gebouwen van Adelante in Valkenburg. De eerste ronde aan modelberekeningen is gereed. Een analyse van de resultaten is in uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Doorkijk komende periode voor pijler 1

- Voortzetten onderzoeken van bouwstenen voor het uitvoeringspakket voor het Geulgebied;
- Opstarten onderzoeken voor de andere werkgebieden (pre-verkenningen);
- Nadere uitvoering kansenregeling en opstart tweede tranche;
- Het netwerk met kennisinstellingen verder uitbreiden om samen maatregelen en maatregelpakketten te ontwikkelen.



## 4.2 Water en Bodem sturend - Pijler 2

Pijler 2 richt zich op slimme keuzes in de ruimtelijke ordening en het type landgebruik. Een goede ruimtelijke ordening draagt bij aan waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast. We kunnen daardoor sturen op de gebieden waar waterbelang ontwikkelingen wel of niet zijn gewenst. De T100/2100 kaarten die zijn gemaakt geven hier inzicht in. Ook zetten we in op het watervriendelijk maken van het landgebruik; daartoe ontwikkelen we een instrumentenkoffer en een grondstrategie.

Parallel aan de werkgebiedsaanpak ontwikkelen we een risicogerichte normering systematiek. De instrumenten vanuit pijler 2 worden zoveel mogelijk toegepast binnen de integrale aanpak in de werk- en stroomgebieden. Om in de 4 werkgebieden tot een vergelijkbare aanpak (met maatwerk) te komen ontwikkelen we een spoorboekje, de WRL Leidraad.

| Activiteit                                                                                     | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Voortgang implementatie aanbevelingen nationale Beleidstafel Hoogwater en wateroverlast</i> | Op de landelijke terugkomdag van 27 januari 2025 is de aanpak van WRL gepresenteerd. De landelijke voortgangsrapportage is op 10 april 2025 in het BO Water goedgekeurd en wordt ter informatie aan de Tweede Kamer toegestuurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Ruimte voor water – handelingsperspectief en kaart</i>                                      | In opdracht van WRL heeft het Waterschap Limburg een nieuwe wateroverlastkaart en een waterveiligheidskaart gemaakt die een waterbeeld tonen dat volgens een klimaatprognose van het KNMI in 2100 eens per 100 jaar kan voorkomen (T100/2100). Dit komt ongeveer overeen met de hoeveelheid neerslag die in 2021 boven Zuid-Limburg is gevallen. Deze producten zijn op 7 april 2025 in de RAT vastgesteld en gepubliceerd en worden als 'module' opgenomen in de Onderlegger Water en Bodem Limburg. In juni zijn Onderlegger, module en kaarten besproken met gemeenten in zowel Zuid-Limburg (gezamenlijke werkregio's Zuid) als Noord-Limburg (Waterpanel Noord). De kaarten zijn gebruikt bij de formulering van ruimtelijk beleid in de Provinciale Omgevingsvisie. Het Waterschap Limburg gebruikt de kaarten bij haar advisering aan gemeenten bij ruimtelijke plannen. Eerste ervaringen hebben geleerd dat een aantal verbeteracties op de kaarten moeten worden doorgevoerd. Dit gebeurt in de tweede helft van 2025. |
| <i>Grondstrategie en overige instrumenten</i>                                                  | Een goede instrumentenmix en de ontwikkeling van een afgestemde grondstrategie kost meer tijd dan voorzien. Ook wordt juridisch advies ingewonnen bij Europa Decentraal, en wordt ingezet op een stevigere samenwerking. Oplevering van de rapportage is eind 2025. Tegelijkertijd is er overleg met de Provincie om tot een realistische inschatting te komen hoe WRL-middelen voor de korte termijn ingezet kunnen worden voor grondverwerving en afwaardering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Verkenning risicogerichte normering</i>                                                     | Sinds het voorjaar van 2025 wordt voor dit onderwerp intensief samengewerkt met het Waterschap die via een motie van het Algemeen Bestuur opdracht hebben gekregen om een visie te ontwikkelen en uit te werken voor risicogerichte normering voor zowel de Maas als de regionale beken. Tevens wordt afstemming gezocht met de Bovenregionale Stresstest die in 2025 wordt uitgevoerd, gecoördineerd door de Provincie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Leidraad aanpak werk- en stroomgebiedsplannen.</i>                                          | In 2024 is door een extern adviesbureau een set met uitgangspunten opgesteld dat als kader wordt gehanteerd bij de verkenning van de stroomgebieden. Van hieruit wordt nu gewerkt aan een Leidraad. Deze Leidraad geeft richting bij het opstellen van vergelijkbare werkgebieds- en stroomgebiedsplannen én die als toetsingskader kan dienen voor de latere beoordeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Doorkijk komende periode voor pijler 2

- Definitief maken Leidraad aanpak werk- en stroomgebiedsplannen;
- Verbeteracties overstromingskaarten T100-2100;
- Uitwerken instrumenten grondgebruik en delen ervaringen;
- Uitwerken grondstrategie;
- Uitwerking methodiek risicogerichte normering in samenhang met de bovenregionale stresstest.



## 4.3 Waterbewustzijn en waterweerbaarheid - Pijler 3

### 4.3.1 Early Warning

Waterschap Limburg en WRL werken samen aan het versneld ontwikkelen van early warning systemen waarmee belanghebbenden 24/7 kunnen worden geïnformeerd/gewaarschuwd voor dreigende wateroverlast en droogte. Met als hoger doel de gevolgen van wateroverlast en de gevolgen van droogte te beperken, en daarmee voor de omgeving de veiligheid zoveel mogelijk te verhogen en overlast te minimaliseren.

| Activiteit                                      | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Quick win waarschuwen en informeren</i>      | Waterschap Limburg biedt een website en app met waterstanden aan. Een nieuwe ontwikkeling is het versturen van push-berichten zodra de waterstand wijzigt. Zo kunnen burgers sneller en beter worden geïnformeerd. Deze functionaliteit wordt naar verwachting in het najaar geïmplementeerd. Tevens wordt gewerkt aan de optimalisatie van communicatiestromen, zodat één duidelijke communicatielijn ontstaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende verantwoordelijkheden van Waterschap Limburg, de veiligheidsregio's en de gemeenten.                                                    |
| <i>Aanpassingen aan het systeem FEWS Geul</i>   | Om de voorspellingscapaciteit te verbeteren wordt het bestaande hoogwatervoorspelsysteem van de Geul aangepast. De aanpassingen worden in augustus 2025 afgerond. Gebruikers van FEWS-Geul krijgen daarna een toelichting over de nieuwe functionaliteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>AI4Water</i>                                 | Het AI-onderzoeksproject AI4Water, met TU Delft als leadpartner, is ingediend bij de Nationale Waterschapsagenda van NWO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Interreg NWE-project Flash Flood Breaker</i> | Binnen Early Warning worden verschillende acties uitgevoerd als onderdeel van het Interreg-project Flash Flood Breaker. In de afgelopen periode is gekeken naar de toepassing van een AI-model voor overstromings- en impactvoorspelling. Dit model wordt getest in een andere regio door Emschergenossenschaft und Lippeverband. WRL laat een vergelijkbare test uitvoeren in een gebied met hellingen. De test vindt plaats in het gebied van de Selzerbeek.<br><br>Als andere actie wordt door de universiteit van Luxemburg gekeken naar de verklaarbaarheid van AI-modellen. WRL heeft hiervoor het Roer |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | machine learning model van WL aangedragen. De eerste resultaten worden verwacht in november 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Markt orientatie Early Warning systemen</i> | Om de verdere ontwikkeling en implementatie van een early warning systeem voor te bereiden, is een marktoriëntatie uitgevoerd. Met als doel om een goed en actueel inzicht te verkrijgen in de beschikbare oplossingen en technologische mogelijkheden die momenteel op de markt worden aangeboden. De aanbesteding wordt eind dit jaar afgerond, zodat tijdig kan worden gestart met de uitvoering van het gekozen early warning systeem. De aanbesteding wordt uitgevoerd door Waterschap Limburg. |

#### 4.3.2 Waterweerbaarheid

Dit spoor is gericht op het ontwikkelen van producten en diensten om inwoners te helpen om zich beter voor te bereiden en te beschermen.

| Activiteit                                             | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Water Adviesteams en woningscans</i>                | In april 2025 is de pilot woningscans afgerond. Van de 1.647 uitgenodigde huishoudens, heeft circa 33% deelgenomen aan een woningscan. Van deze deelnemers gaf 60% aan daadwerkelijk maatregelen te willen treffen naar aanleiding van het advies. Uit de evaluatie komt naar voren dat de woningscan een redelijk effectief instrument is, zij het met enkele aandachtspunten voor verbetering. Deze punten worden meegenomen in een brede vervolgaanpak.<br>Ook de Water Adviesteams zijn geëvalueerd. Gemeentebesturen geven aan tevreden te zijn over de werkwijze en het doel van de teams. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de beperkte capaciteit bij de gemeenten een knelpunt vormt. |
| <i>Complexe gebouwscans</i>                            | In Q2 is een pilot uitgevoerd naar bescherming van gebouwen met een maatschappelijke functie. Bijvoorbeeld een ziekenhuis, zorginstelling, datacentrum en museum. In totaal zijn 12 complexe gebouwscans uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Draaiboek voor buurten</i>                          | Op basis van de evaluatie van de woningscans is gewerkt aan een herziening van de buurt draaiboeken. Deze gaan onderdeel uitmaken van een geïntegreerde aanpak op buurtniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Draaiboek voor recreatiesector</i>                  | In samenwerking met HISWA-Recron is gewerkt aan een draaiboek voor de recreatiesector. Hiervoor is input opgehaald tijdens een bijeenkomst met verschillende ondernemers uit de recreatieve sector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Bijeenkomst voor instellingen met een collectie</i> | In samenwerking met het Huis voor de Kunsten is op 23 januari 2025 een evenement georganiseerd voor instellingen met een collectie. Deze instellingen hebben te maken met een specifieke problematiek als het gaat om de conservatie en restauratie van kwetsbare kunst. Aan de hand van lezingen, een informatiemarkt en workshops is aandacht besteed aan een betere voorbereiding op wateroverlast.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Publicaties</i>                                     | De brochures en meterkastkaart zijn verspreid tijdens inwonersbijeenkomsten, evenementen en de woningscans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 4.3.3 Waterbewustzijn en educatie

Dit spoor maakt inwoners van Limburg bewust van de risico's op wateroverlast in hun omgeving. Hiervoor worden onder andere campagnes ingezet vanuit Wacht niet op water.

| Activiteit                      | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ambassadeurscampagne</i>     | In navolging van de twee ambassadeurscampagnes in 2024 is in het voorjaar de video met het verhaal van Cecile uit Arcen gedeeld. In dit verhaal staat samenwerking en voorbereiding in de buurt centraal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Informatiepakket</i>         | In februari is een gratis informatiepakket aangeboden met als inhoud: brochure, meterkastkaart en een meetlat/peilstok. Er waren 500 informatiepakketten beschikbaar en deze zijn binnen drie weken allemaal aangevraagd. Via een enquête is onderzocht wat men van het pakket vond. De leerpunten worden meegenomen in de doorontwikkeling van de producten.                                                                                                                                                                     |
| <i>Risk Factory</i>             | Tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen sinds dit jaar ook terecht bij de Risk Factory Limburg-Noord voor zes nieuwe scenario's. Op 13 februari vond de feestelijke opening plaats. WRL draagt als partner financieel en inhoudelijk bij en helpt zo bij het versterken van het waterbewustzijn en de waterweerbaarheid van jongeren. Hiervoor is het scenario 'Extreem weer' ontwikkeld, waarin thema's als wateroverlast, droogte, hitte en stormen aan bod komen.                                           |
| <i>Inwonersonderzoek</i>        | WRL liet een inwonersonderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in het waterbewustzijn en de weerbaarheid van inwoners. Ruim 1500 Limburgers hebben meegedaan aan het onderzoek. Dit was de eerste meting van een monitor die jaarlijks wordt herhaald. Zo kunnen trends in het waterbewustzijn en de weerbaarheid van Limburgers de komende jaren worden gevolgd.                                                                                                                                                                 |
| <i>Publiekstool waterhoogte</i> | Voor de website is een nieuwe tool in ontwikkeling waarmee inwoners aan de hand van hun postcode en huisnummer kunnen checken of ze mogelijk te maken kunnen krijgen met wateroverlast. Hiervoor wordt data gebruikt uit de nieuwe T100/2100 overstromingskaarten en overstromingsdata van de Maas. De tool wordt in de zomer getest en afgestemd met de WRL-partners. Tevens wordt gewerkt aan een bewustwordingcampagne waar deze tool onderdeel van uit maakt. De bedoeling is om de tool en campagne in november te lanceren. |

### Doorkijk komende periode voor pijler 3

- Continueren ontwikkeling early warning systeem in samenwerking met het Watermanagement Center Limburg;
- Opstellen van een integrale buurtaanpak inclusief woningscans;
- Ontwikkelen vervolgaanpak voor diverse vormen van woningscans;
- Doorontwikkelen content en middelen om inwoners concreet handelingsperspectief te bieden;
- Inzet van gedragsinterventies om daadwerkelijk handelen verder te stimuleren en meer inwoners voorbereid te laten zijn op wateroverlast;
- De samenwerking zoeken met de verzekeringsector.



#### 4.4 Water in Balans

Het programma WRL en het programma Water in balans van Waterschap Limburg werken intensief samen om de regio beter bestand te maken tegen de steeds groter wordende uitdagingen van de klimaatverandering. Er wordt op allerlei niveaus samengewerkt. Van de integrale aanpak in de stroomgebieden en het verhogen van de zelfredzaamheid van inwoners tot de samenwerking met buurlanden.

In de werkgebieden wordt een deel van de opgave van WRL gerealiseerd via het programma Water in Balans. Water in Balans werkt aan oplossingen voor lokale wateroverlastknelpunten bij de zijlopen van de regionale beken. Het gaat veelal om locaties waar niet aan de geldende beschermingsnorm wordt voldaan. Deze locaties liggen in gebieden waar ook wordt gewerkt aan een voorkeursvariant voor het hele stroomgebied, van bron tot monding. De Water in Balans projecten krijgen uiteindelijk een plek in de voorkeursvariant.

Een overzicht van lopende projecten van Water in balans is te vinden op <https://metelkaar.waterschaplimburg.nl>

## 5 Doelrealisatie en -monitoring werkgebieden

WRL werkt in vier werkgebieden aan een integrale aanpak vanuit het principe van meerlaagsveiligheid. Per werkgebied worden afspraken gemaakt over de bestuurlijke samenwerking, voor welke opgaven in het gebied een WRL-aanpak wordt gemaakt en welke stroomgebieden of knelpunten prioriteit hebben.

### Per gebied samen aan de slag

Wateroverlast en overstromingen nemen door klimaatverandering toe. Om Limburg beter te beschermen werken overheden samen in het programma **Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)**

**Limburg is hiervoor opgedeeld in 4 werkgebieden:**

- |                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> Maastricht-Heuvelland             | <b>3</b> Midden-Limburg |
| <b>2</b> Parkstad en Westelijke Mijnstreek | <b>4</b> Noord-Limburg  |

**Per werkgebied stellen betrokken overheden een gezamenlijk werkgebiedsplan op.**

Daarin afspraken over:



**bestuurlijke samenwerking**



**aanpak van knelpunten**



**solidariteit in het watersysteem**

WRL regisseert het proces en elk werkgebied wordt aangestuurd door een eigen **bestuurlijk regieteam**.



**Per gebied wordt bepaald:**

- ?** welke opgaven liggen er voor WRL?
- ?** welk stroomgebied of knelpunt heeft prioriteit?

**Voor iedere opgave verkennen we maatregelen om voorbereid te zijn op het klimaat van 2100.**

Daarbij baseren we ons op 3 pijlers:



**1 Fysieke maatregelen**  
(water vasthouden, bergen en afvoeren)



**2 Water en bodem sturend**  
(slimme ruimtelijke keuzes)



**3 Waterbewustzijn en waterweerbaarheid**  
(iedereen voorbereiden)



**Het bestuurlijk regieteam kiest een voorkeurspakket met maatregelen.**

Ook worden er afspraken gemaakt over uitvoering en financiering. De Bestuurscommissie WRL beslist over de bijdrage vanuit WRL-middelen.

## 5.1 Leidraad

Vanuit pijler 2 wordt een leidraad opgesteld die richting geeft bij het opstellen van werk- en stroomgebiedsplannen én die als toetsingskader kan dienen voor de beoordeling van concrete maatregelen. De Leidraad wordt in nauw overleg met de WRL-partners opgesteld. Op 28 mei is de leidraad uitvoerig besproken met bestuurders van de RAT. Aansluitend met de AOG op 11 juni en vervolgens in een ambtelijke 2-daagse met de partners op 23/24 juni. De Leidraad wordt in een ambtelijke werkgroep met de partners verder uitgewerkt. Gestreefd wordt naar vaststelling begin 2026 door de nieuwe Bestuurscommissie WRL.

Het samenwerken om tot een leidraad te komen en de inhoudelijke discussies die hierbij komen kijken, versterken het WRL-netwerk en onze gezamenlijke boodschap naar buiten.

## 5.2 Afwegingen in kader van de werk- en stroomgebiedsaanpak

Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) werkt samen aan een Limburg dat goed beschermd is tegen de gevolgen van overstromingen. Er wordt gebouwd aan een stevig en toekomstbestendig regionaal watersysteem. WRL zorgt ervoor dat partners goed samenwerken en dat plannen voor wateroverlast sneller en beter worden uitgevoerd.

Naast een opgave gerichte samenwerking, met maatregelen gericht op (1) fysiek robuust watersysteem, (2) ruimtelijke ordening en (3) waterbewustzijn en waterweerbaarheid staat een integrale aanpak van bron tot monding per stroomgebied in de werkgebieden centraal. Over grenzen heen en vanuit het principe van systeemsolidariteit wordt per gebied gewerkt aan een samenhangend maatregelenpakket voor de lange termijn. Daarnaast wordt gewerkt aan een korte termijn impulsaanpak, waarbij uitvoeringsprojecten naar voren worden gehaald om in de werkgebieden concrete stappen te zetten. Beide sporen dragen bij aan het realiseren van een robuust en klimaatadaptief regionaal watersysteem in Limburg.

WRL hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

- Integrale benadering van de aanpak van wateroverlast en waterveiligheid door in te zetten op meerlaagsveiligheid (gecombineerde inzet van pijler 1 fysieke maatregelen, pijler 2 ruimtelijke inrichting en pijler 3 waterbewustzijn en weerbaarheid) en in de fysieke maatregelen het hele palet te benutten: water vasthouden (sponswerking), bergen, afvoeren. Voor het stroomgebied van de Geul is als uitwerking hiervan een kansenskaart opgesteld waarin de potentie van natuurlijke maatregelen en sponswerking maximaal in beeld zijn gebracht en volwaardig worden betrokken bij de formulering van de voorkeursvariant.
- Vergroten draagvlak en uitvoeringskracht door het inrichten van een eigen governance met het instellen van een Bestuurscommissie WRL en Bestuurlijke Regie Teams voor de vier werkgebieden, waarin de vier vertegenwoordigende overheden worden opgenomen.
- Ondersteuning van individuele partners bij het uitwerken en realiseren van (deel) opgaven die bijdragen aan een robuust en klimaatadaptief regionaal watersysteem in Limburg. WRL neemt NIET de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de partners over.
- De focus van WRL ligt op het boven-normatieve wat een duidelijke afbakening is ten opzichte van het programma Water in Balans van Waterschap Limburg en de gemeentelijke water- en rioleringsplannen.

Op basis van deze WRL uitgangspunten is in de eerste helft van 2025 gestart met het opstellen van een WRL Leidraad Aanpak werk- en stroomgebieden. Deze leidraad gaat als een spoorboekje fungeren voor het verkenningproces.

### 5.3 Werkgebied Maastricht-Heuvelland

Voor het stroomgebied van de Geul is het proces om te komen tot de voorkeursvariant gestart. Hiervoor is in november 2024 de kennisgeving voornemen en participatie gepubliceerd en ter inzage gelegd. De ontvangen reacties (63) op deze kennisgeving zijn beantwoord. Begin 2025 zijn acht werksessies in het stroomgebied georganiseerd, waar ideeën en bestaande knelpunten zijn opgehaald als inspiratie voor de verdere aanpak. In een online peiling is geïnventariseerd welke aspecten inwoners belangrijk vinden. Dit wordt meegenomen in het beschrijven van de verschillende varianten die worden onderzocht.



De onderzoeken naar fysieke maatregelen zijn verder opgestart en worden eind 2025 afgerond. Daarnaast zijn de modelontwikkelingen (m.n. het model voor bovenstroomse effecten) opgestart. De procedure om te komen tot een plan-MER is gestart. Als eerste wordt daarvoor een notitie reikwijdte en Detailniveau (NRD plan-MER) opgesteld. Daarin worden de bestuurlijk uit te werken varianten beschreven.

#### *Internationale samenwerking*

Met Belgische grenspartners wordt een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. Daarin wordt vastgelegd hoe we met de uitkomsten van de grensoverschrijdende onderzoeken omgaan en welke maatregelen worden getroffen in het Belgische deel van het stroomgebied. Naast samenwerking met de Waalse gemeenten Raeren, Plombière, Kelmis, Lontzen en Welkenraedt, de Provincie Luik en de Service Public de Wallonie wordt voorzien in de toetreding van de Vlaamse Provincie Limburg en de gemeente Voeren.

#### **Doorkijk komende periode voor werkgebied Maastricht-Heuvelland**

- Opstellen Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD plan-MER) inclusief benoemen te onderzoeken varianten;
- Onderzoeken fysieke maatregelen (bouwstenen voor de varianten);
- Samenwerkingsovereenkomst België.



### 5.4 Werkgebied Parkstad-Westelijke Mijnstreek

In het laatste kwartaal van 2024 is de eerste opzet voor een werkgebiedsplan besproken met de bestuurlijke trekkers van de werkregio Parkstad-Westelijke Mijnstreek. In deze periode is de voorgestelde aanpak verder verdiept.

Met de ambtelijke vertegenwoordigers van de werkregio's is in twee sessies verder ingegaan op de voorgestelde aanpak. Deze voorziet in een synergetische aanpak van de bovenregionale stresstesten, het WRL-proces en de thema's wateroverlast en beperken gevolgen door overstromingen in de 2<sup>e</sup> cyclus van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie.

### Doorkijk komende periode voor werkgebied Parkstad-Westelijke Mijnstreek

- Uitwerken werkgebiedsplan voor de regio Parkstad-Westelijke mijnstreek;
- Inrichten ambtelijk en bestuurlijk regieteam;
- Plan van aanpak stroomgebied Geleenbeek.



## 5.5 Werkgebied Midden-Limburg

In de tweede helft van 2024 is een gezamenlijke aanpak van de verkenning voor het HWBP-traject Roermond en het stroomgebiedsplan Roer opgestart. De samenhang tussen beide programma's is groot maar vanwege verschillende procedures, bevoegdheden en financiering kunnen beide verkenningen niet zonder meer worden samengevoegd. Derhalve is door het Waterschap en WRL eerst een gezamenlijke startnotitie opgesteld die op 29 april 2025 door beide partijen op directieniveau is geaccordeerd.

Op basis hiervan is besloten om alvorens met beide verkenningen te starten eerst een gezamenlijke kwartiermakers fase Maas-Roer te doorlopen, om de onderlinge afhankelijkheid van het hoofdwatersysteem Maas en regionaal watersysteem Roer goed in beeld te krijgen. Op basis hiervan wordt geadviseerd over de organisatie van het vervolg. Deze aanpak is met bestuurders van de RAT besproken tijdens de heisessie van 28 mei. Gestreefd wordt naar oplevering van dit advies in het najaar, waarna invulling kan worden gegeven aan de organisatie en bemensing van de verkenningfase voor Maas-Roer.

### *Internationale samenwerking*

In samenwerking met het Wasserverband Eifel-Rur wordt een grensoverschrijdende stresstest uitgevoerd, om retentiemogelijkheden in beeld te brengen langs de Roer tussen de stuwmeren in de Eiffel tot aan de grens met Nederland.

### Doorkijk komende periode voor werkgebied Midden-Limburg

- Uitwerken kwartiermakersfase;
- Bemensing en organisatie van de verkenningfase Maas-Roer;
- Opvolging van de uitkomsten van de stresstest bespreken met partners over de grens.



## 5.6 Werkgebied Noord-Limburg

Half maart is de kwartiermaker voor Noord-Limburg gestart binnen WRL. De eerste fase lag de focus op het verbinden van het programma aan het gebied. Hiertoe hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met bestuurders en ambtenaren in het gebied. Op 17 juni vond een interactieve sessie plaats met waterambtenaren uit het werkgebied.

In bestuurlijke verkenningen zijn drie prioritaire thema's naar voren gekomen waarin WRL een rol kan spelen:

- Samenhang tussen hoofd- en regionale watersystemen;
- Economische schade door wateroverlast (m.n. landbouw);
- Droogteproblematiek in kwetsbare gebieden.

Er is echter nog vooronderzoek nodig om de WRL-opgave goed in beeld te krijgen en methodisch te kunnen starten met het WRL-proces zoals dit in de leidraad wordt verwoord. In de komende maanden worden de eerste uitgangspunten voor de samenwerking uitgewerkt, inclusief het proces van bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit Limburg Noord.

### Doorkijk komende periode voor werkgebied Noord-Limburg

- Voorbereiden vooronderzoek;
- Vaststellen eerste uitgangspunten tijdens een bestuurlijk moment in september 2025.

## 6 Netwerkontwikkeling

Voor de realisatie van de WRL opgave zijn partnerschap en samenwerking noodzakelijk. Dit vraagt tevens aandacht voor een nieuwe manier van werken. De betrokken partijen zijn samen en integraal aan de slag voor de hoogwaterveiligheid van Limburg. In onderlinge samenwerking en met inzet van ieders eigen kracht, expertise en verantwoordelijkheid focust het programma WRL voortdurend op de wijze waarop de meeste impact kan worden behaald. Deze manier van werken levert een versterkte betrokkenheid in de werkgebieden maar vraagt ook om te luisteren naar elkaar en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Grensoverschrijdend, passend in het huidige internationale tijdbeeld, met voortdurende aandacht voor het onderling informeren en meenemen in de strategievorming. Samen met onze regionale en nationale partners én onze burens is de insteek om tot een veerkrachtig systeem te komen. Niet alleen het “wat” maar ook het “hoe” komt meer op de gezamenlijke agenda.

### *Ambtelijk en bestuurlijk samenspel inclusief strategisch relatiebeheer*

Na de hoogwaterproblematiek in Limburg in 2021 ligt er een kans om te laten zien dat onze regio kan bijdragen aan oplossingen voor nationale problemen. Door op inhoud strategische allianties te creëren, de samenhang met onze strategische kernboodschap en aanpak regelmatig gezamenlijk te doorleven (ambtelijk en bestuurlijk) en aan te vullen vanuit maatschappelijke vraagstukken, wordt de impact richting uitvoering groter en dus effectiever. De partners van WRL hebben naast een gezamenlijke inzet op communicatieboodschappen, middelen en toolkits ook versterkt ingezet op informatie- en kennisuitwisseling door het organiseren van bijeenkomsten in de regio. Afgelopen half jaar is daarnaast tevens aandacht uitgegaan naar het proactief voorbereiden van strategisch relatiebeheer, een gezamenlijke uitwerking van een boodschap en de wijze van aanpak en timing van communiceren. Gezamenlijke netwerkontwikkeling voor de lange termijn is de eerste stap. Hier horen ook werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten bij.

### *Werkbezoek Deltacommissaris Co Verdaas op 8 mei 2025*

Deltacommissaris Co Verdaas bracht donderdag 8 mei een werkbezoek aan Limburg. Tijdens dit bezoek stond de gezamenlijke aanpak van wateroverlast in het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg centraal. Thema's als systeemsolidariteit, meerlaagsveiligheid, risicogerichte normering en de integrale aanpak per stroomgebied stonden centraal. Tijdens een rondgang langs verschillende locaties is gesproken over de uitdagingen en kansen die hierbij komen kijken. Het werkbezoek bevestigde het belang van samenwerking om wateroverlast effectief aan te pakken.



### *Belang van een gezamenlijke analyse en korte en lange termijn aanpak als communicerende vaten*

Kunst is om niet direct in actie te schieten, maar juist de gezamenlijke analyse snel, goed en structureel te maken. Dat legt de basis voor strategisch netwerken, maar ook voor een transitie in de samenwerking en maken van keuzes richting uitvoering.

Korte termijn activiteiten zijn vaak direct zichtbaar. Het vertalen van ervaring, opstellen van analyses en inhoud voor het vormgeven van uitvoeringsplannen en een beïnvloedingsstrategie voor de

middellange en langere termijn, geeft pas later resultaat maar is daarom niet minder van belang voor de gewenste effectiviteit. Het belang van een integraal strategisch netwerk daarbij is duidelijk. Juist samen langs directe lijnen reflecteren over brede context en hoe we elkaar kunnen versterken bij het profileren van de Limburgse opgave in Den Haag en Brussel, geeft zichtbaarheid aan het samen effectief uitvoeren van de opgave. Het maakt het brede gebied van de Euregio Maas Rijn zichtbaar als we de ervaringen en ontwikkelingen die we doorlopen bij WRL van nut laten zijn om een mogelijk toekomstige EU hoogwateraanpak te voeden.

Borging voor inzet op lange termijn is nog een uitdaging. Hoe gaan we die focus vasthouden over regeerperioden heen? Hoe kunnen we vanuit de euregionale insteek en de verschillende politieke termijnen toch aandacht voor de inhoudelijke (gezamenlijke) aanpak van het complexe Limburgse waterveiligheidsvraagstuk realiseren? WRL realiseert dit door het aangaan van allianties en het inrichten van effectief partnerschap en nieuwe manier van samenwerken. Structurele inzet op deze manier van samenwerken en ook de tijd die dat vergt wordt nu geborgd in de verschillende betrokken organisaties. Iets kan tenslotte pas groeien als het aandacht krijgt. Inzet is om onze agenda's aan elkaar te koppelen en de onderlinge relaties met elkaar te versterken.

## 7 Internationale samenwerking

In de rapportageperiode heeft WRL verdere stappen gezet in het opbouwen van een internationale programmatische samenwerking. In deze periode is daarnaast actief gewerkt aan de positionering en introductie van het WRL-programma binnen de internationale context. De concrete resultaten hiervan staan beschreven in dit hoofdstuk.

### 7.1 Programmatische samenwerking op stroomgebiedsniveau

In de werkgebieden Maastricht-Heuvelland en Midden-Limburg zijn reeds concrete activiteiten ondernomen ter versterking van de internationale samenwerking. Zie hoofdstuk 5 voor de beschrijving van de internationale activiteiten in de werkgebieden.

### 7.2 Internationale projecten

In onderstaande tabel staat een overzicht van internationale projecten met concrete betrokkenheid van WRL. In de rapportageperiode is de aanwervingsprocedure voor een projectmanager EU-gefinancierde projecten succesvol afgerond. De nieuwe medewerker start op 1 september 2025, waardoor WRL de inzet op Europees gefinancierde projecten verder kan intensiveren.

| Activiteit                                      | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Interreg NWE-project Flash Flood Breaker</i> | Dit project draagt bij aan pijler 3 van WRL. De totale projectkosten voor de werkpakketten van WRL bedragen € 1,128 miljoen, waarvan 60% (€ 0,677 miljoen) wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Aan het project nemen 14 partners deel uit 6 landen. WRL levert, samen met lead partner Emschergenossenschaft, de grootste inhoudelijke bijdrage. In de rapportageperiode is verder gewerkt aan de verschillende werkpakketten. Tevens is actief deelgenomen aan bijeenkomsten met (inter)nationale projectpartners, gericht op het uitwisselen van kennis en het verkennen van relevante initiatieven. |
| <i>Interreg MR-Project Flood Wisdom</i>         | Dit project is geselecteerd door Interreg Maas-Rijn. Waterschap Limburg is de Lead-partner en WRL werkt als associated partner mee in verschillende werkpakketten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Interreg MR-project Sponge</i>               | SPONGE is een interessant project dat op innovatieve wijze invulling geeft aan brongerichte aanpak van wateroverlast en droogte. In de rapportageperiode vond de aanvraag plaats van dit project waarin een 10-tal partners uit de Euregio samenwerken, waaronder 3 gemeenten uit Wallonië waarmee WRL ook samenwerkt in het stroomgebied van de Geul. Het Wereld Natuur Fonds is lead partner.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>International community on floods - ICoF</i> | De community heeft als doel om grensoverschrijdende samenwerking te versterken en kennisuitwisseling te stimuleren op het gebied van klimaatadaptatie en hoogwaterbeheer. Het is een initiatief van WRL en de EGTS Euregio Maas-Rijn. De geplande bijeenkomst van 18 juni in Eupen werd uitgesteld naar 13 november 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>JCAR Atrace</i>                              | WRL heeft regelmatig overleg met JCAR Atrace, een samenwerkingsprogramma voor toegepast wetenschappelijk onderzoek naar overstromings- en droogterisicobeheer in regionale stroomgebieden. Deze samenwerking is van strategisch belang voor WRL, voor uitwisseling van kennis en inzichten en om op de hoogte te blijven van relevante onderzoeksontwikkelingen binnen het vakgebied.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>IGOS Landelijke overleg</i>                  | WRL neemt deel aan het landelijke IGOS-overleg, waarin wordt verkend hoe grensoverschrijdende samenwerking kan bijdragen aan de volgende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | fase van de uitvoering van de aanbevelingen van de Beleidstafel Hoogwater en Wateroverlast. WRL kan hier ervaringen en inzichten vanuit internationale samenwerking inbrengen en bijdragen aan de landelijke aanpak van waterveiligheid en klimaatadaptatie. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3 Internationale werkbezoeken

| Activiteit                                                                       | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Werkbezoeken aan Brussel - 3/4/2025</i>                                       | Om de internationale samenwerking te versterken, zijn werkbezoeken aan Brussel georganiseerd. Tijdens deze bezoeken vond overleg plaats met vertegenwoordigers van het Secretariaat-Generaal Benelux, medewerkers van het kabinet van Vlaams minister Brouns en het Huis van de Nederlandse Provincies. Doel was het verkennen van kansen voor verdere samenwerking. De besproken thema's omvatten onder andere kennisdeling, stroomgebiedsplannen, early-warningsystemen, gezamenlijke waterprojecten en een gezamenlijke lobby voor een EU Klimaatadaptatie Faciliteit. |
| <i>Werkbezoek Stadkreis Aachen - 29/4/2025</i>                                   | Het Early Warning-team bracht een werkbezoek aan de Städteregion Aachen om met Duitse collega's te verkennen op welke onderdelen samenwerking mogelijk is bij de verdere ontwikkeling van het Early Warning-systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Werkbezoek Nationaal Crisiscentrum België (NCCN) - 21/5/2025</i>              | Medewerkers van het Nationaal Crisiscentrum van België (NCCN) brachten een bezoek aan het Early Warning-team van WRL. Tijdens dit bezoek gaven zij een toelichting op de ontwikkeling van het nieuwe open-source Paragon-systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Werkbezoek Algemeen bestuur Waterschap Limburg aan Plombières - 20/6/2025</i> | WRL ontving een afvaardiging van het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg in Plombières. Tijdens het werkbezoek gaf WRL een toelichting over de grensoverschrijdende samenwerking en de lokale watergerelateerde problematiek in de regio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>NRW Enquetekommission - 30/6/2025</i>                                         | Tijdens het bezoek van de NRW Enquetekommission aan Waterschap Limburg heeft WRL een toelichting gegeven op het doel en de innovatieve aanpak van het programma WRL. Daarnaast is het project in het stroomgebied Roer-Maas besproken, waarbij de werkwijze voor het identificeren van relevante taken en hun onderlinge verbanden werd toegelicht.                                                                                                                                                                                                                       |

#### Doorkijk komende periode voor internationale samenwerking

- Door de aanstelling van een projectleider voor EU-gefinancierde projecten wordt de fondsenwerving via Europese middelen verder versterkt;
- De contacten met de Benelux-Unie worden verder geïntensiveerd, met als doel de input vanuit de Benelux Waterdag van 29 november 2023 op te nemen en te vertalen naar een structurele samenwerking met de partners van de Benelux-Unie. De Benelux Waterdag eind 2025 wordt hierbij gezien als een belangrijke mijlpaal;
- De lobbyactiviteiten in Den Haag, Brussel en Düsseldorf worden verder uitgebouwd en vormgegeven.

## 8 Communicatie en participatie

De communicatie en participatie/omgevingsdialoog is gericht op:

- Uitleggen en zichtbaar maken wat WRL doet;
- Bewustwording: iedereen kan een steentje bijdragen aan een betere voorbereiding en bescherming;
- Begrip en draagvlak voor de integrale aanpak en gedeelde betrokkenheid.

### *Communicatiestrategie: samen worden we waterweerbaar*

In de communicatie wordt steeds de verbinding gelegd tussen wat de overheid doet om wateroverlast te verminderen en wat mensen zelf kunnen doen om zichzelf en hun omgeving te beschermen: dit doen wij, dit kun jij doen. Het is allebei nodig om Limburg waterveiliger te maken, want (extreme) wateroverlast is nooit helemaal te voorkomen. Het gevoel van een collectieve verantwoordelijkheid wordt hiermee versterkt. Samen worden we waterweerbaar!

### *WRL en Wachtnietopwater*

WRL is afzender van programmacommunicatie en gebieds- en projectcommunicatie. Hierbij wordt steeds benadrukt dat WRL een samenwerkingsprogramma is van overheden in Limburg. Communicatie en campagnes gericht op het verhogen van waterbewustzijn en waterweerbaarheid vinden plaats onder de noemer Wacht niet op water. Bij het inwonersonderzoek dat in het voorjaar van 2025 is uitgevoerd, is de bekendheid van WRL en Wacht niet op water gemeten. Hieruit blijkt dat drie op de tien inwoners WRL van naam kennen, een kleiner deel (6%) weet wat het programma inhoudt. Van de groep die bekend is met wat WRL inhoudt, is 73% (zeer) positief over WRL. De website wachtnietopwater.nl is bij ongeveer 8% van de inwoners bekend. De website is bekender bij inwoners die ooit wateroverlast hebben ervaren.



Bekendheid van WRL bij inwoners is geen doel, een positieve houding ten opzichte van de activiteiten van WRL is dat wel. Bekendheid van Wacht niet op water is wel belangrijk, zodat inwoners weten waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden vanuit de overheid over voorbereiden op wateroverlast. De komende tijd wordt verder gewerkt aan het verhogen van de bekendheid en vindbaarheid van wachtnietopwater.nl.

### *Eenduidige communicatie en communicatienetwerk*

De ambitie is om vanuit alle overheden op een eenduidige manier te communiceren over de gezamenlijke opgave om Limburg waterweerbaarder te maken. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen – overheden, bedrijven en inwoners. WRL ontwikkelt daarvoor in samenwerking met de partners communicatieboodschappen, middelen en toolkits die partners kunnen gebruiken voor verspreiding via hun eigen kanalen. Samenwerking vindt plaats in werkgroepen en via email-updates worden communicatiemedewerkers van de partners op de hoogte gehouden van communicatieactiviteiten. Tevens organiseert WRL jaarlijks een communicatiebijeenkomst om informatie en kennis uit te wisselen. De volgende bijeenkomst is in oktober 2025 en wordt samen met Waterklaar georganiseerd.

## Activiteiten

In de rapportageperiode is gewerkt aan de volgende activiteiten:

| Activiteit                                           | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uitleggen en zichtbaar maken</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Nieuwsbrieven</i>                                 | WRL geeft drie digitale nieuwsbrieven uit waarvoor mensen zich via de website kunnen aanmelden. De algemene WRL-nieuwsbrief is in de rapportageperiode vijf keer verschenen. Begin 2025 is gestart met twee nieuwe publieksniewsbrieven. De nieuwsbrief Wacht niet op water met tips en inspiratieverhalen om schade door wateroverlast te verminderen is vier keer uitgekomen. Daarnaast is er een nieuwsbrief specifiek voor bewoners van het Geulgebied om te informeren over de voortgang van de verkenning. Deze nieuwsbrief is twee keer uitgekomen.                      |
| <i>LinkedIn</i>                                      | De LinkedIn pagina van WRL draagt bij aan het zichtbaar maken waar we als programma aan werken. Vrijwel wekelijks is een bericht gepubliceerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Toolkits voor partners</i>                        | Er zijn weer diverse toolkits ter beschikking gesteld aan de partners om via hun eigen kanalen te communiceren over activiteiten van WRL. Onderwerpen zoals: inwonersonderzoek, peiling Geulgebied, verlenging kansenregeling en informatiepakket met informatie om voor te bereiden op wateroverlast.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Pers en media</i>                                 | In het voorjaar is een persgesprek georganiseerd over de nieuwe T100/2100 overstromingskaarten. Dit heeft geleid tot berichtgeving in diverse media.<br><br>L1 heeft naar aanleiding van een nieuwsbericht op de website een reportage gemaakt over de complexe bouwscan bij Woonzorgcomplex Rothermolen.<br><br>Bij de start van de werkateliers in het gebied Maastricht-Heuvelland is de werkgebiedsmanager geïnterviewd door L1 radio.                                                                                                                                      |
| <b>Verhogen waterbewustzijn en waterweerbaarheid</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Website wachtnietopwater.nl</i>                   | In oktober 2024 is de nieuwe website <a href="http://www.wachtnietopwater.nl">www.wachtnietopwater.nl</a> gelanceerd. Op deze website vinden inwoners tips en informatie wat ze zelf kunnen doen, hoe de overheid daarbij helpt en wat de gezamenlijke overheden doen om wateroverlast te verminderen. De website is in deze periode meer dan 46.000 keer bezocht.<br><br>De website wordt continu doorontwikkeld met verdiepende content en nieuwe tools. Zo wordt gewerkt aan een 'waterhoogtewijzer' en bijbehorende campagne om in oktober 2025 te lanceren (zie pijler 3). |
| <i>Publicatie in VIA</i>                             | Iedere maand wordt een hele pagina gepubliceerd in de VIA-weekkrant die huis-aan-huis en via verschillende afhaalpunten wordt verspreid (oplage 333.000). De pagina wordt ingezet voor het delen van inspiratieverhalen en uitleg wat de overheid doet om wateroverlast te verminderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Campagnes en communicatieve interventies</i>      | Samen met pijler 3 is gewerkt aan diverse informatiemiddelen en campagnes (zie pijler 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Omgevingscommunicatie en participatie</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Verkenning stroomgebied Geul</i>                  | Om het verkenningproces van het Geulgebied en de complexe opgave uit te leggen, zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld waaronder een subwebsite <a href="http://www.wachtnietopwater.nl/geul">www.wachtnietopwater.nl/geul</a> en een nieuwsbrief. Verder heeft communicatie plaatsgevonden om inwoners uit te nodigen voor acht werkateliers. Er is een online peiling ingericht die via de kanalen van de partners en een social media campagne onder de aandacht is                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | gebracht bij bewoners van het gebied. 800 personen vulden de peiling in. Tevens is gecommuniceerd over de resultaten van de werkateliers en de peiling. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Doorkijk komende periode voor communicatie en participatie

- Lanceren publiekstool waterhoogte en campagne waterbewustzijn;
- Verdiepen content (handelingsperspectief) op website [www.wachtnietopwater.nl](http://www.wachtnietopwater.nl) en verhogen bekendheid en vindbaarheid;
- Uitwerken WRL-verhaal en ontwikkelen communicatiemiddelen;
- Uitwerken communicatiestrategie waterbewustzijn en waterweerbaarheid ;
- Inrichten communicatie voor overige werkgebieden.

## 9 Programmabeheersing

Binnen het programmabeheersingsteam is afgelopen half jaar ingezet op de continuïteit van beheersing en het doorontwikkelen van planning-, risico- en financieel management. Naast de doorlopende beheersingsprocessen staat voor het komend half jaar het doorontwikkelen van een sturingsplanning, de begroting 2026 en het uitwerken van een financiële strategie op de planning. De voortgang van de programmafinanciering is terug te vinden in hoofdstuk 10.

### 9.1 Contractmanagement

Contractmanagement heeft in deze rapportageperiode een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van de uitvoering. Er is actief gestuurd op het beheersen van afspraken, het bewaken van de voortgang en het faciliteren van goede samenwerking met stakeholders. Naast het beheer van bestaande contracten is actief ingezet op nieuwe contracten. Door deze combinatie van beheer en vooruitkijken is er meer grip op kosten, kwaliteit en risico's, en wordt het programma beter ondersteund met de juiste externe capaciteit en deskundigheid op het juiste moment.

### 9.2 Planningsmanagement

In het afgelopen half jaar is gewerkt aan het nog beter inzichtelijk maken en inplannen van mijlpalen van de vier werkgebieden en de drie pijlers.

Parallel aan deze planningen op inhoudelijk niveau wordt komend half jaar de sturingsplanning doorontwikkeld. In deze sturingsplanning worden inhoudelijke mijlpalen, bestuurlijke en communicatie-momenten en belangrijke afhankelijkheden op een overzichtelijke manier weergegeven.

In bijlage 1 staat de overzichtsplanning, waarin per pijler en werkgebied de belangrijkste inhoudelijke mijlpalen zijn weergegeven.

### 9.3 Risicomanagement

Risicomanagement is cyclisch geborgd binnen het WRL programma. Onder leiding van de risicomanager zijn structurele risicosessies en -overleggen binnen alle teams van het programma uitgevoerd. De uitkomsten van deze gesprekken worden vastgelegd in het risicodossier dat beschikbaar is voor alle teamleden. Er wordt gestuurd op beheersmaatregelen van de belangrijkste en meest actuele risico's. De grootste risico's zijn ten opzichte van voortgangsrapportage 3 hetzelfde gebleven. In onderstaande tabel is de actuele stand van zaken per top risico beschreven.

| Risico                                         | Omschrijving actuele stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vertraging in uitvoering en bestedingen</i> | Belangrijkste oorzaak is dat het erg lastig is om het programmateam op sterkte te krijgen en te houden. WRL kan zelf geen personeel in vaste dienst nemen, heeft te maken met strikte regels vanuit de wet DBA en een krappe arbeidsmarkt. Met het instellen van de bestuurscommissie wordt met en door de samenwerkingspartners gewerkt aan meer flexibiliteit in het aannemen van mensen, waardoor de kans op vertragingen in uitvoering en bestedingen, veroorzaakt door te weinig capaciteit, wordt verkleind. |
| <i>Bemensing</i>                               | Zie ook bovenstaand. WRL zet bij het opstellen van het AO_IB in op meer flexibiliteit ten aanzien van dienstverbanden en een gezamenlijke werving en selectiewijze met de partners bij het duurzaam invullen van functies.. Goede ontwikkeling is dat meer medewerkers vanuit de moederorganisaties zijn benoemd op vacante functies.                                                                                                                                                                              |
| <i>Onderuitputting</i>                         | In de vorige voortgangsrapportage staat dat de ingeschatte besteding van de SPUK-gelden voor de periode 2023 t/m 2025 achterblijft. In overleg met het ministerie van I&W is deze SPUK verlengd tot en met 2026. De huidige verwachting is dat eind 2026 niet het                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | volledige bedrag uit de SPUK is besteed. Het bedrag dat niet wordt benut, vloeit terug in het Deltafonds en blijft daarmee in de toekomst beschikbaar voor het programma. Daarnaast wordt het begrotingsproces binnen de het programma aangescherpt en wordt gekeken naar versnellingsmaatregelen. |
| <i>Ontbreken slagvaardigheid</i>           | Het instellen van de bestuurscommissie en bijbehorende AO_IB draagt bij aan de beheersing van dit risico. Relatie met lokale partners wordt versterkt.                                                                                                                                             |
| <i>Verlies van efficiëntie</i>             | Het instellen van de bestuurscommissie en bijbehorende AO_IB draagt bij aan de beheersing / aanzienlijke verkleining van dit risico.                                                                                                                                                               |
| <i>Vertraging op inhoudelijk resultaat</i> | Door het duurzaam bemensen van het programma, wordt dit risico beheerst / verkleind. Daarnaast is planningsmanagement binnen het programma operationeel zodat op de (inhoudelijke) voortgang wordt gestuurd.                                                                                       |

## 10 Programmafinanciering

Het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stelt incidenteel € 300 miljoen beschikbaar voor maatregelen in de beekdalen van de zijrivieren van de Maas in Limburg. Hieraan is de voorwaarde gekoppeld dat uit de regio ook € 300 miljoen wordt ingebracht. Dit is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst van 27 juli 2022. Dit budget is beschikbaar voor de meerjarige programmatische aanpak van naar verwachting 10 tot 15 jaar. Voor de eerste vier jaar wordt € 32,4 miljoen middels een SPUK aan WRL uitgekeerd. In dit hoofdstuk staat de verantwoording van de SPUK en de begroting van 2025.

### 10.1 SPUK Beekdalen zijrivieren Maas Limburg

Van de toekenningsbeschikking incidentele specifieke uitkering Beekdalen zijrivieren Maas Limburg (SPUK) van het Ministerie van I&W ter hoogte van € 32.408.092, zijn drie tranches van totaal € 24.772.963 ontvangen. De SPUK was oorspronkelijk toegekend voor drie jaar. In maart 2025 is de looptijd van de SPUK, op verzoek van WRL, met één jaar verlengd tot 31 december 2026. De SPUK-middelen worden op de provinciale balans geplaatst als vooruitontvangen post en worden jaarlijks door Gedeputeerde Staten afgeroepen ten behoeve van de exploitatierekening.

#### Betalingsschema SPUK

|      | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | Totaal       |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| SPUK | € 7.941.475 | € 9.331.488 | € 7.500.000 | € 7.635.129 | € 32.408.092 |

### 10.2 Begroting en dekking 2025

De programmabegroting WRL voor 2025 is door de RAT op 10 december 2024 goedgekeurd en sluit op € 21.167.309 (exclusief BTW). Dekking vindt als volgt plaats:

|                       | Begroting 2025      | Dekking 2025        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Begroting 2025        | € 21.167.309        |                     |
| SPUK min I&W          |                     | € 12.729.309        |
| Water in Balans*      |                     | € 7.438.000         |
| Reserve WRL Provincie |                     | € 1.000.000         |
| Gemeenten             |                     |                     |
| <b>Totaal</b>         | <b>€ 21.167.309</b> | <b>€ 21.167.309</b> |

\* Een deel van de regionale financiering wordt gerealiseerd via het programma Water in Balans van Waterschap Limburg

### 10.3 Bestedingen Q1 en Q2 2025

| Onderdeel                     | Gerealiseerd in Q1 en Q2, 2025 |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Capaciteit                    | € 1.535.600                    |
| Programmakosten               | € 431.936                      |
| Kansenregeling <sup>1)</sup>  | € 1.027.436                    |
| Totaal <sup>2)</sup>          | € 2.994.972                    |
| Water in Balans <sup>3)</sup> | € 1.800.000                    |

<sup>1)</sup> Toegekend subsidiebedrag.

<sup>2)</sup> Totaal gerelateerd aan SPUK Beekdalen zijrivieren Maas

<sup>3)</sup> Totaal regionale financiering middels Water In Balans

Met een doorkijk naar de bestedingen in de tweede helft van het jaar, is de verwachting dat de bestedingen achter blijven ten opzichte van de begroting voor 2025. Dit komt onder andere doordat de aanbesteding van een zeer complexe raamovereenkomst voor ingenieursdiensten veel tijd kost. Middelen die aan het eind van de looptijd van de SPUK (31-12-2026) niet zijn benut, vloeien terug in het Deltafonds en blijven daarmee in de toekomst beschikbaar voor het programma. Geconcludeerd is dat de begroting van 2025 te ambitieus is ingestoken. De begroting van 2025 wordt tweede helft van 2025 aangepast en er worden procesverbeteringen doorgevoerd bij het opstellen van de begroting 2026.

Bij het programma Water in Balans van Waterschap Limburg, als onderdeel van de regionale financiering voor WRL, blijven de bestedingen achter bij de begroting. Voorzien wordt dat dit in de tweede helft van 2025 wordt ingelopen.

#### **10.4 Herfasering middelen**

Uit een evaluatie blijkt dat de middelen zoals in de SPUK zijn voorzien (bij het toekennen van de SPUK in 2023), niet aansluiten bij de financieringsbehoefte van het programma. WRL zit in de verkenningsfase om tot maatregelpakketten te komen voor de werkgebieden. Grote bestedingen worden pas verwacht in de uitvoeringsfase die start na afronding van de verkenningsfase en de planvoorbereidingsfase. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt onderzocht of een herfasering van middelen mogelijk is. De voor WRL beschikbare middelen zijn opgenomen in het Deltafonds. Door het afroepen van middelen uit het Deltafonds deels door te schuiven in de tijd, kan beter worden aangesloten bij de liquiditeitsbehoefte van het programma.

#### **10.5 BTW compensatiefonds**

De fiscalisten van de hostorganisatie zijn in overleg met de Belastingdienst over de onderdelen van het programma waarvoor een beroep kan worden gedaan op het BTW compensatiefonds. Dit overleg wordt naar verwachting in Q4 2025 afgerond.

#### **10.6 Begroting 2026**

De begroting voor 2026 wordt opgesteld in Q3 ter vaststelling door de Bestuurscommissie in Q4 2025. De begroting sluit aan bij de aangescherpte werkgebied- en pijlerplannen, waarbij een bestedingenplanning wordt opgesteld. Dit moet leiden tot een meer realistische inschatting van bestedingen in 2026.

## Bijlage 1 Voortgang en actuele planning WRL

Deze tabel toont de belangrijkste planningsmijlpalen per onderdeel. Per mijlpaal is het meest gunstige planningsscenario opgenomen. De belangrijkste planningsrisico's en de mogelijke uitloop als gevolg van het optreden daarvan, zijn toegevoegd.

| Mijlpaal                                                     | Planning VGR3 | Planning VGR 4                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| <b>Pijler 1 – Fysieke maatregelen</b>                        |               |                                              |
| Kansenregeling                                               | Q4 2024       | Q4 2025, wegens succes is tranche 1 verlengd |
| <b>Pijler 2 – Water en bodem sturend</b>                     |               |                                              |
| Implementatie aanbevelingen Beleidstafel                     | Doorlopend    | Doorlopend                                   |
| Ruimte voor water - Handelingsperspectief en kaart           | Q2 2025       | Q4 2025                                      |
| Grondstrategie en overige instrumenten                       | Q3 2025       | Q4 2025 uitbesteed                           |
| Verkenning risicogerichte normering                          | Q3 2027       | Q3 2027                                      |
| Leidraad uitgangspunten en beoordelingscriteria              | Q2 2025       | Q4 2025                                      |
| Verankering in POVI (en/of GOVI)                             | Q4 2025       | Q4 2025                                      |
| Tijdelijke voorzorgmaatregelen                               | Gereed        | Gereed                                       |
| <b>Pijler 3 – Waterbewustzijn en waterweerbaarheid</b>       |               |                                              |
| Early Warning – verbetering systeem                          | Q2 2025       | Q2 2025                                      |
| Early Warning – verwerken in communicatiestrategie           | Q4 2025       | Q4 2025                                      |
| Water Adviesteams in 9 pilotgemeenten in uitvoering          | Gereed        | Gereed                                       |
| Start keuze en uitvoeren (complexe) woningscans              | Q2 2025       | Q2 2025                                      |
| Start en evaluatie Water Adviesteams en scans                | Q2 2025       | Q2 2025                                      |
| Draaiboeken voor buurten                                     | Q2 2025       | Q2 2025                                      |
| Bijeenkomst voorbereiden voor instellingen met een collectie | Gereed        | Gereed                                       |
| Publicaties                                                  | Q1 2025       | Q1 2025                                      |
| <b>Werkgebied Maastricht-Heuvelland</b>                      |               |                                              |
| Vorming Bestuurlijk overleg                                  | -             | Gereed                                       |
| Vaststelling werkgebiedsplan (incl. stroomgebiedsplan Geul)  | Q1 2024       | Gereed                                       |
| Verkenningfase                                               | Q4 2027       | Q4 2027                                      |
| Verkenningsonderzoeken                                       | Q4 2025       | Q4 2025                                      |
| Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD plan-MER)               | Q1 2026       | Q1 2026                                      |
| Ontwerp programma Stroomgebied Geul (ingevolge de OgW)       | Q2 2027       | Q3 2027                                      |
| Definitief programma stroomgebied Geul (OgW)                 | Q4 2027       | Q4 2027                                      |
| Planvoorbereidingsfase                                       | 2028          | 2028                                         |
| Realisatiefase                                               | 2028 e.v.     | 2028 e.v.                                    |
| <b>Werkgebied Parkstad-Westelijke mijnstreek</b>             |               |                                              |
| Opstellen en vaststelling werkgebiedsplan                    | Q3 2025       | Q3 2025                                      |
| Plan van aanpak stroomgebied Geleenbeek                      | Q3 2025       | Q3 2025                                      |
| Verkenningfase                                               | Q4 2027       | Q4 2027                                      |
| <b>Werkgebied Midden-Limburg</b>                             |               |                                              |
| Opstellen werkgebiedsplan                                    | Q3 2025       | Q4 2025                                      |
| Plan van aanpak stroomgebied Roer                            | Q3 2025       | Q3 2025                                      |
| Verkenningfase                                               | Q4 2027       | Q4 2027                                      |

| <b>Werkgebied Noord-Limburg</b> |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Opstellen werkgebiedsplan       | Q3 2025 | Q3 2025 |
| Verkenningfase                  | Q2 2026 | Q2 2026 |

## Bijlage 2 Toegekende beschikkingen kansenregeling

### Toegekende beschikkingen op 30 juni 2025:

- 7-3-2025 Bescherming villa Nieuw Ehrenstein
- 26-3-2025 Omvormen kelder naar waterbuffer
- 2-4-2025 Tijdelijk bergen van water bij nieuwbouwwijk CPO Grasheim
- 8-4-2025 Hoogwatergeul Nijswiller
- 16-4-2025 Bescherming Frankenhofmolen
- 16-4-2025 Hemelwaterafvoer nieuwbouw
- 30-4-2025 Verminderen wateroverlast De Vaart in Geleen
- 14-5-2025 Realiseren van een waterbassin
- 4-6-2025 Wateropslag in oude mestputten
- 4-6-2025 Waterafvoer erf naar achterliggend gebied
- 13-6-2025 Vergroten bergingsvolume buffers centrum Voerendaal
- 20-6-2025 Verbreden, verhogen, verstevigen waterkering c.q. aardewal
- 20-6-2025 Vergroten waterveiligheid Platsbeekweg/Stegelstraat Nuth
